

공약명	제2호수공원 조성 추진				
주관부서 (팀명)	녹지과 (공원계획팀)	과장 담당자	김종천 김희경 이경진	연락처	8075-4361 8075-4366 8075-4367

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지과) 공원·녹지부분 협의 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 22. 7.: 공원녹지 조경계획(안) 사전회의 (제2의 호수공원 조성 건의) - 22.10.: LH) 수변특화 및 물순환 system masterplan용역 → 호수공원 구체화 ○ 신도시정비과) 별말마을 편입 지구계획 변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 22. 7.: 지구계획 보고회 개최(창릉천 저류지 보 설치, 호수공원 조성) - 22. 7.: 국토교통부 건의(제2호수공원 조성) - 23. 7.: 지구계획 자문회의 3차 추진 ○ LH) 수변특화 및 물순환시스템 masterplan 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 23. 2. 8. ~ 24. 8. 8. - 용역사: (주)건화 - 과업목적: 창릉천 활용 수변특화계획 - 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> · 23. 2. 26.: 자문위원(2명) 추천 및 위촉 · 23. 3. 3.: 착수보고회 · 23. 5. 25.: ‘창릉천 통합하천’ 전문가 지문 ○ LH) 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시 설계용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 23. 5. 17. ~ 26. 11. 16. - 용역사: (주)CA조경기술사사무소 - 설계범위: 공원·녹지 등 1,204천㎡ - 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> · 23. 6. 8.: 착수보고회 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지과) 창릉지구 제2호수공원 조성 건의 <ul style="list-style-type: none"> - 23. 6.: 국토부장관 초청 간담회 건의 → 23. 9. 회신결과 “신중검토” ○ LH) 수변특화 및 물순환시스템 masterplan 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 23. 2. 8. ~ 24. 8. 8. - 용역사: (주)건화 - 과업목적: 창릉천 활용 수변특화계획 - 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> · 23. 8. 3.: 중간보고 및 회의(1차) · 23. 9. 22.: 관련부서 회의(2차) · 23.12.(예정): 관련부서 회의(3차) ○ LH) 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시 설계용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 23. 5. 17. ~ 26. 11. 16. - 용역사: (주)CA조경기술사사무소 - 설계범위: 공원·녹지 등 1,204천㎡ - 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> · 23. 9. 22.: 수변특화 공원조성회의(1차) · 23.12.(예정): 수변특화 공원조성회의(2차) 	
<p style="text-align: center;">2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ LH) 수변특화 및 물순환시스템 masterplan 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 23. 2. 8. ~ 24. 8. 8. - 용역사: (주)건화 - 과업목적: 창릉천 활용 수변특화계획 - 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> · 24.상반기: 관련부서 협의 / 최종보고회 · 24. 8. 8.: 용역완료 ○ LH) 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시 설계용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 23. 5. 17. ~ 26. 11. 16. - 용역사: (주)CA조경기술사사무소 - 설계범위: 공원·녹지 등 1,204천㎡ - 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> · 24.상반기: 수변특화 공원 실시설계 · 24.하반기: 관련부서 협의 및 공사발주 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
3	-	3	2	3

- 1) 공약 관련 회의
 - 공원녹지 조경계획 관련부서 회의(1회, 2022. 7. 14.)
 - 수변특화 용역 관련부서 회의(1회, 2023. 8. 3.)
 - 수변특화 및 공원녹지 실시설계용역 관련부서 회의(1회, 2023. 9. 22.)
- 2) 전문가 자문
 - 수변특화 용역 착수보고회(전문가 자문포함)(1회, 2023. 3. 3.)
 - 창릉천 통합하천사업 전문가 자문회의(1회, 2023. 5. 25.)
 - 공원녹지 기본 및 실시설계용역 착수보고회(전문가 자문포함)(1회, 2023. 6. 8.)
- 3) 언론/방송 보도
 - 고양소식지(23년 361호, 2023. 3. 2.)
 - 시민신문 특집기사(1회, 23. 8 .21.)
- 4) 기타
 - 수변특화 용역 자문 전문가 추천(2023. 2. 26.)
 - 국토교통부장관 초청 간담회 건의 및 회신(23. 6. 9. / 23. 9. 20.)
 - (대곡~소사 선 개통식) 대통령방문 건의(23. 7. 1.)

□ 연도별 투자계획 - 비예산사업

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 자체 추진이 아닌 국토교통부(승인) 및 LH(시행)에 따른 협의 애로
- 제2호수공원 확보를 위한 과제 및 마스터플랜 선행 검토 필요
 - 벌말마을 편입 등 지구단위계획(변경)
 - 수변특화 및 물순환 system masterplan용역
 - 그 외 사람(人)길 마스터플랜 및 공공디자인 수립용역 등
- 창릉천 및 저류지 활용 '제2호수공원'조성에 따라 수원확보 및 수질개선 등 관련분야 전문적, 기술적 검토 애로

○ 개선대책

- (신도시정비과) 국토교통부, LH와 지구계획 변경, 다각적 대안제시 등 지속적 협의
- (녹지과) LH 관련 용역 착수, 중간보고회 등 관련부서와의 회의 추진
 전문가 추천 전문·기술적 검토 병행
- (생태하천과) 창릉천 통합하천사업 전문가자문 및 용역을 통한 검토 병행

□ 관련 사진




수변특화 용역 착수보고회(전문가 자문포함)



공원녹지 기본 및 실시설계용역 착수보고회
(전문가 자문 포함)



수변특화 및 실시설계 용역 관련부서 회의

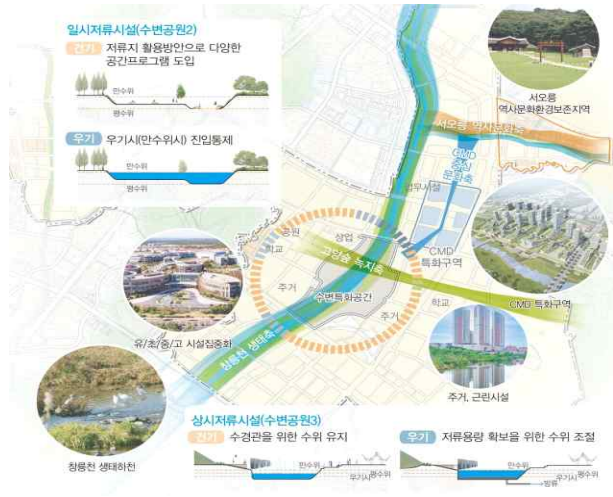

창릉천 주변 수변특화대상지
