

<b>공약명</b>	<b>복합환승센터 연계 대곡역세권 개발특구 조성</b>				
<b>주관부서 (팀명)</b>	도시계획정책관 (도시계획팀)	<b>과장 담당자</b>	김진철 방은경	<b>연락처</b>	8075-3070 8075-3071 8075-3073

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	○ 국토교통부 사전 협의 추진	
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	○ 대곡역세권 지식융합단지 추진 발표 (24.11.5.) ○ 대곡역세권 지식융합단지 지정을 위한 공람공고 (24.11.5. ~ 25.) ○ 대곡역세권 지식융합단지 지정을 위한 관계기관 협의	
2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)	○ 대곡역세권 지식융합단지 지구지정을 위한 각종 영향평가 추진 ○ 대곡역세권 지식융합단지 사업화 방안 용역 추진 ○ 대곡역세권 지식융합단지 전문가 협의체 구성 및 운영	

### □ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

### □ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
대곡역세권 개발사업	국비	120			120				
	도비								
	시비								
	기타	120			120	미정	미정	미정	미정

### □ 연도별 확보(집행)액


(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
대곡역세권 개발사업	국비	120 (0)			120 (0)				
	도비								
	시비								
	기타	120 (0)			120 (0)				

### □ 관련 사진



대곡역세권 지식융합단지 지정 발표

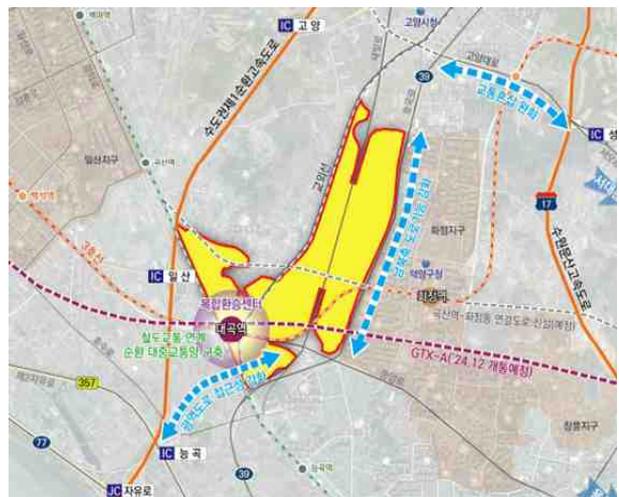

대곡역세권 지식융합단지 지정 발표
