

공약명	생활스포츠 도시 구현을 위한 스포츠복합단지 조성				
주관부서 (팀명)	체육정책과 (체육시설팀)	과장 장장 담당자	박천재 정일형 송송관	연락처	8075-2320 8075-2340 8075-2341

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주교동(국도39호선) 고가하부 테니스장 조성 - 2022. 12. 테니스장 2면 조성 완료 ○ 대장동(국도39호선) 고가하부 체육시설 조성 - 2022. 12. 족구장 2면 및 풋살장 1면 조성 완료 ○ 흥도동 고가하부 체육시설 조성 - 2023. 5. 게이트볼장 1면, 다목적구장 1면 조성완료 ○ 원당동 고가하부 체육시설 조성 - 2023. 6. 게이트볼장, 족구장 조성 완료 ○ 삼송배드민턴장 증축공사 완료 - 2023. 1. 배드민턴장 연면적 188㎡ 증축 완료 ○ 관산근린공원 다목적구장 건축허가 완료 및 공사 발주 	
하반기 추진실적 (2023.7. ~12.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장산IC 하부 체육시설 조성공사 - 2023. 8. 인조잔디 및 헨스 교체 등 완료 ○ 행주동 고가하부 체육시설 조성공사 실시설계(11월) - 피클볼장 설치 등 체육시설 조성 ○ 국도39호선 및 수도권 순환도로 고가하부 체육시설 조성공사 실시설계(11월) - 격파장, 피클볼장 등 체육시설 조성 ○ 삼송동 우수지 테니스코트 조성공사 실시설계(11월) - 테니스코트 5면 조성 ○ 성석동 스포츠 콤플렉스 조성공사 기본계획 착수(11월) - 야구장을 포함한 스포츠 콤플렉스 조성 ○ 성사시립테니스장 전천후구장 건립공사 착공(12월) - 테니스장 전천후구장 조성 ○ 탄현근린공원 내 다목적구장 조성공사 준공(12월) - 족구장 및 부대시설 조성 ○ 킨텍스 우수지 체육시설 조성 실시설계(12월) - 테니스장 5면 및 부대시설 조성 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비고
2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행주동 고가하부 체육시설 조성공사 준공 - 2024. 3. 피클볼장 설치 등 체육시설 조성 완료예정 ○ 성사시립테니스장 전천후구장 건립공사 준공 - 2024. 5. 테니스장 전천후구장 조성 완료예정 ○ 국도39호선 및 수도권 순환도로 고가하부 체육 시설 조성공사 준공 - 2024. 5. 격파장, 피클볼장 등 체육시설 조성 완료예정 ○ 삼송동 우수지 테니스코트 조성공사 준공 - 2024. 5. 테니스코트 5면 조성 완료예정 	

□ **시민참여(소통) 실적**

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	3	-	2	-

- 1) 설명회 : 원신3통 주민설명회(2023. 1. 30.), 도내10통 주민설명회(2023. 1. 30.), 일산동 주민설명회(2023. 2. 6.)
- 2) 언론보도 : 고양시민 맞춤형 생활체육 지원확대(2023. 5. 23). 고양시 관산다목적구장 등 생활체육시설 대폭 확충(2023. 5. 27.)

□ **연도별 투자계획(사업비)**

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		3,090	140	2,950					
관산근린공원 다목적구장 신축	국비								
	도비								
	시비	2,950		2,950					
	기타								
고양동 스포츠타운 조성사업	국비								
	도비								
	시비	미정*	60						
	기타								
성석동 스포츠복합단지 조성사업	국비								
	도비								
	시비	미정*	80						
	기타								

*현재 도시관리계획(변경) 결정 용역 시행 중
으로, 완료 후 예산계획 상세내역 도출

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		3,640 (1,134)	140 (140)	2,950 (994)	550 (0)				
관산근린공원 다목적구장 신축	국비								
	도비								
	시비	3,450 (994)		2,950 (994)	500 (0)				
	기타								
고양동 스포츠타운 조성사업	국비								
	도비								
	시비	60 (60)	60 (60)						
	기타								
성석동 스포츠복합단지 조성사업	국비								
	도비								
	시비	130 (80)	80 (80)		50 (0)				
	기타								

□ 문제점 및 개선대책


○ 문제점

- 체육시설 소외지역 고양동 스포츠타운 조성사업은 도시관리계획(변경)결정 용역 후 사업 예산 확정 가능하며, 토지매입비 및 공사비 예산확보 필요
- 수요자 중심 시설종목을 확정하여 체육시설 이용자들의 만족도 제고

○ 개선대책

- 지역 도의원을 통한 특조금 확보 등 국비, 도비 적극적 확보 방안 마련
- 단계적 주민설명회를 통한 시설확정으로 남녀노소 즐길 수 있는 쾌적한 스포츠 환경 조성 노력

□ 관련 사진

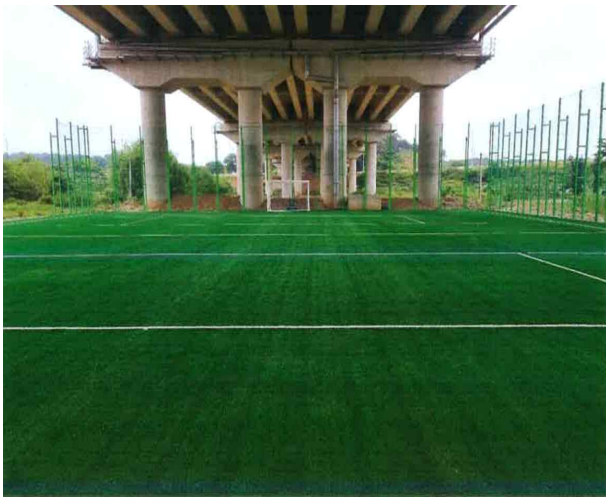

흥도동 고가하부 체육시설 조성 완료




장산IC 하부 체육시설 조성 완료



관산근린공원 다목적구장 착공후 대지조성 공사중



킨텍스 유수지 테니스장 조성공사 공사전

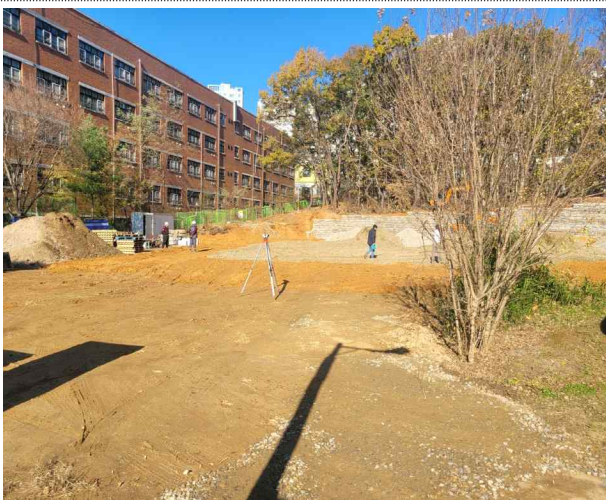

탄현근린공원 다목적구장 조성 공사중



삼송동 유수지 테니스코트 조성 공사전
