【추진단계 : 이행후계속】

교육문화9

공약명	영어전문도서관 조성				
주관부서 (팀명)	덕양구도서관과 (시설팀)	과 장 팀 장 담당자	최경숙 허창우 송영호	연락처	8075-9010 8075-9021 8075-9024

❑ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	○ 백석도서관 리모델링 TF구성 및 추진 - '23. 3.13. 백석도서관 리모델링 TF 구성 - '23. 4.11. TF 1차 회의 - '23. 6. 1. TF 2차 회의 - '23. 6.14. 기본계획 수립 관련 회의 - '23. 6.16. TF 3차 회의 - '23.11.13. TF 4차 회의 - '23.11.27. TF 5차 회의 - '23.12. 6. TF 6차 회의 - '23.12.19. TF 7차 회의 - '24. 1. 2. TF 8차 회의 - '24. 3.20. 기획용역 최종보고회 및 TF 9차 회의 ○ 도서관 벤치마킹 추진 - '22. 6.16. 의왕글로벌도서관 벤치마킹 - '23. 3.16. 특성화도서관 벤치마킹(3군데) - '23. 5. 9. 주제 전문도서관 벤치마킹(2군데) - '23. 8.22. 공간구성관련 벤치마킹 - '23. 10.16. 하남시 신규도서관 벤치마킹(2군데) - '23. 10.17. 파주중앙도서관 벤치마킹 - '23. 10.23. 천안청수도서관 벤치마킹 - '23. 10.30. 서울 구립도서관 및 전문서점 벤치마킹(3군데) - '23. 10.31. 의정부영어도서관 벤치마킹 - '24. 2.15. 영어특화도서관 벤치마킹(2군데) - '24. 3.19. 라이브러리 티티섬 벤치마킹 - '24. 4.15. 남양주시 도서관 벤치마킹(2군데) - '24. 4.22. 신규 개관도서관 벤치마킹(3군데) - '24. 5.20. 부산시 도서관 벤치마킹(2군데) - '24. 5.28. 서울 구립·사립도서관 벤치마킹(3군데) - '24. 5.29. 부천시 도서관 벤치마킹(3군데)	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	○ 공모사업 추진 - '23. 3. 13. 2023년 공공건축물 그린리모델링 희망건축물 목록 제출 - '23. 6. 16. 그린리모델링 전문가 컨설팅 ○ 2023년 공공건축물 그린리모델링사업 선정 - '23. 8. 4. 공공건축물 그린리모델링사업 신청 - '23. 8. 28. 시그니처사업 선정(국도비 58억 확보) ○ 전문가 컨설팅 및 교육 추진 - 공공도서관 건립·운영 활성화지원 사업 컨설팅 • 일 시 : '23. 8. 9.(수) 15:00 • 전문가 : 박찬일교수(건국대 실내건축설계학과), 배경재교수(동덕여대 문헌정보학) - 공공도서관 건립·운영 활성화 지원사업 담당자 교육 • 일 시 : '23. 9. 13.-15. - 영어도서관 운영을 위한 특강 및 워크숍 • 일 시 : '24. 5. 27.(월) 11:00 • 전문가 : 송주희(전 송파어린이영어도서관 관장) ○ 리모델링 기본계획(안) 수립 - '23. 11. 13. 백석도서관 리모델링 추진 기본계획 수립 ○ 지방재정투자심사 완료(심의결과 : 적정) - '23. 11. 14. 제7회 지방재정계획 심의위원회 ○ 건축기획용역 추진 - '23. 10. 31. 제2회 추경 예산수립(34,100천원) - '23. 11. 7. 건축기획용역 계약의뢰 - '23. 11. 22. 백석도서관 리모델링 건축기획용역 착수 - '24. 3.20. 건축기획용역 최종보고회 개최 - '24. 3.21. 용역 완료 및 성과품 납품 ○ 공공건축사업계획 사전검토 - '24. 1.16. 공공건축 사업계획 사전검토 신청 - '24. 2. 8. 공공건축 사업계획 사전검토 완료 ○ 공공건축심의 - '24. 2. 6. 제2회 건축위원회 심의 상정 - '24. 2.27. 제2회 건축위원회 심의(원안의결)	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	❍ 설계공모 추진 - '24. 4. 2. 설계공모 운영위원회 개최 요청 (도시디자인담당관) - '24. 4. 4. 설계공모 운영위원회 1차 회의 - '24. 4. 8. 설계공모 운영위원회 2차 회의 - '24. 4.29. 설계공모 공고 - '24. 5. 2. ~ 16. 참가등록 - '24. 5.13. 현장설명 - '24. 6.14. 작품제출 - '24. 6.24. 심사위원회 개최 및 당선작 선정 (당선작 : 오더메이드건축사사무소)	
2024.하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	❍ 백석도서관 리모델링 TF 회의 추진 - '24. 7. 2. 설계 착수보고회 및 TF 10차 회의 - '24. 9. 4. 민간전문가 자문(1차) 및 TF 11차 회의 (고양시 총괄계획단) - '24. 9. 9. 민간전문가 자문(2차) 및 TF 12차 회의 (고양시 총괄계획단) - '24.10.21. 설계 중간보고 및 TF 13차 회의 ❍ 도서관 벤치마킹 추진 - '24. 8.26. 인제기적의도서관 벤치마킹 - '24. 9.23. 용인시 동천도서관 벤치마킹 - '24.10.14. 원주미리내·여주흥천도서관 벤치마킹 ❍ 설계용역 추진 - '24. 7. 2. 설계용역 착수 - '24.10.22. 설계용역 중간납품 - '24.11.21. 그린리모델링 심의 신청 - '24.12.13. 그린리모델링 심의(예정) ❍ 휴관 마무리 행사 - '24.11.30. '도서관, 잠시만 안녕' 운영 (영어도서관 조성 그린 리모델링 공사 준비)	
2025년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	❍ 설계용역 추진 - '25. 1. . 설계용역 완수 ❍ 공사 추진 - '25. 3. . 공사 착공	

❑ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
13	-	8	3	19(벤치마킹)

1) 공약 관련 회의 : TF회의(13회), 기본계획수립 관련 회의(1회),
2) 전문가 자문 : 공공건축물 그린리모델링 컨설팅(2023. 6. 16.)
공공도서관 건립·운영 활성화지원사업 컨설팅(2023. 8. 9.)
설계공모운영위원회(2024. 4. 4.), (2024. 4. 8.)
영어도서관 운영을 위한 특강 및 워크숍 (2024. 5. 27.)
설계공모 사전기술검토 위원회(2024. 6. 19.)
설계공모 심사위원회(2024. 6. 24.)
민간전문가(고양시 총괄계획단) 자문 1차(2024. 9. 4.)
민간전문가(고양시 총괄계획단) 자문 2차(2024. 9. 4.)
3) 언론/방송 보도 : 공공도서관 건립·운영 활성화지원사업 컨설팅 선정 언론보도(2023. 8. 10.)
공공건축물 그린리모델링 시그니처사업 선정 언론보도(2023. 8. 31.)
KBS1 다큐온 프로그램 백석도서관 방영(2023. 10. 28.)
4) 벤치마킹(19회) : 2023년 9회, 2024년 10회

❑ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		5,000			200	2,800	2,000		
백석도서관 리모델링	국비								
	도비								
	시비	5,000			200	2,800	2,000		
	기타								

❑ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		7,862 (437)			7,362 (0)	500 (422)			
백석도서관 리모델링	국비	5,130 (406)			5,130 (0)	0 (406)			
	도비	1,159 (0)			659 (0)	500 (0)			
	시비	1,573 (31)			1,573 (14)	0 (16)			
	기타								

※ 23년 공공건축물 그린리모델링사업 선정으로 국도비 58억 확보

❑ 관련 사진

벤치마킹(공간구성관련-인제기적의도서관)

전문가 자문(그린리모델링 컨설팅)

전문가 자문(활성화 지원사업 컨설팅)

KBS1 다큐온 방영

전문가 자문(민간전문가[고양시 총괄계획단] 자문 실시)

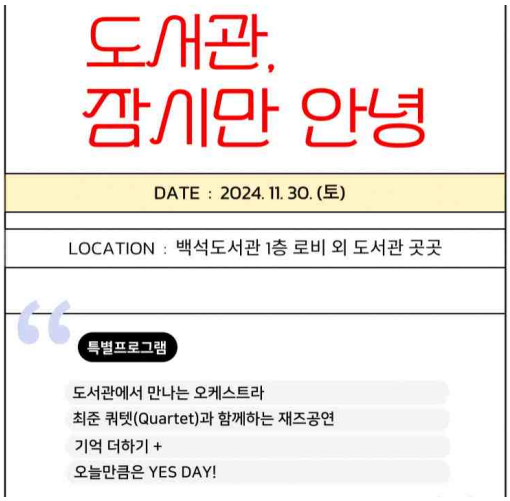

백석도서관 휴관 마무리행사
